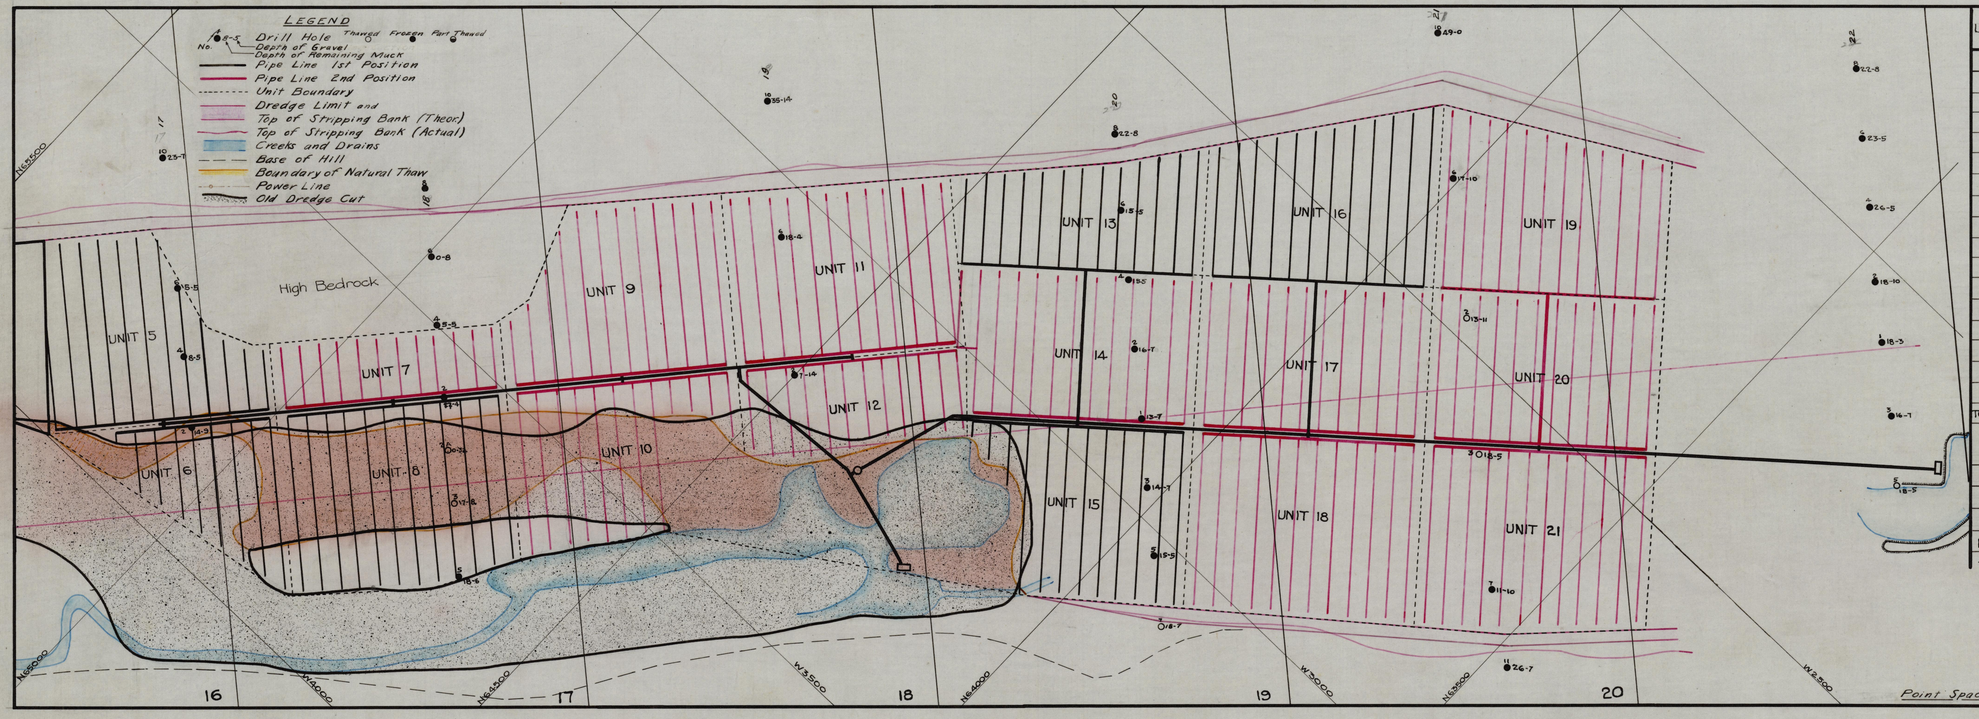

Point Spacing 9 ft Centres.

UNIT	AREA SQ. YDS.	NO. OF POINTS	AVERAGE DEPTH MUCK	GR.	B'K.	TOTAL FOOTAGE	VOLUME CU. YDS.
5	7344	895	12	5	2	15216	46512
6	2989	365	14	9	2	8395	24908
7	3567	435	10	5	2	6525	20313
8	4589	560	13	10	2	12880	38262
9	8145	993	12	7	2	18867	57015
10	4367	533	12	11	2	12259	37392
11	9121	1112	12	9	2	23352	69927
12	4778	583	7	14	2	12243	36631
13	6034	736	15	5	2	14720	44249
14	8179	998	15	6	2	20958	62706
15	7389	900	14	6	2	18000	54186
16	8165	996	13	8	2	20916	62598
17	8091	986	14	7	2	20706	62031
18	9598	1170	14	7	2	24570	73584
19	8385	1022	12	10	2	22484	67080
20	8091	986	13	8	2	20706	62031
21	9673	1180	15	7	2	25960	77384
TOTAL	118505	14450				298757	896809

Probable driving rate per 9hr. shift 225 ft.

Probable driving season May 10 to Aug 20 102 days

Driving crew required Feet ÷ (Days x Rate) 13 men

Order in which units will be driven 5-6-8-7-9-10-11-12 13-15-16-14-18-17-19-21-20

YUKON CONS. GOLD CORP. LTD.

DAWSON Y.T.

No. 10 THAWING LAYOUT

1939 SEASON

DRAWN BY: A.M.N. & H.V.G.W.
TRACED BY: A.M.N.
DATE: Jan. 1939
REVISED:

Scale 1" = 100 Ft.

№ 4030

e011079521

YCGC25103
