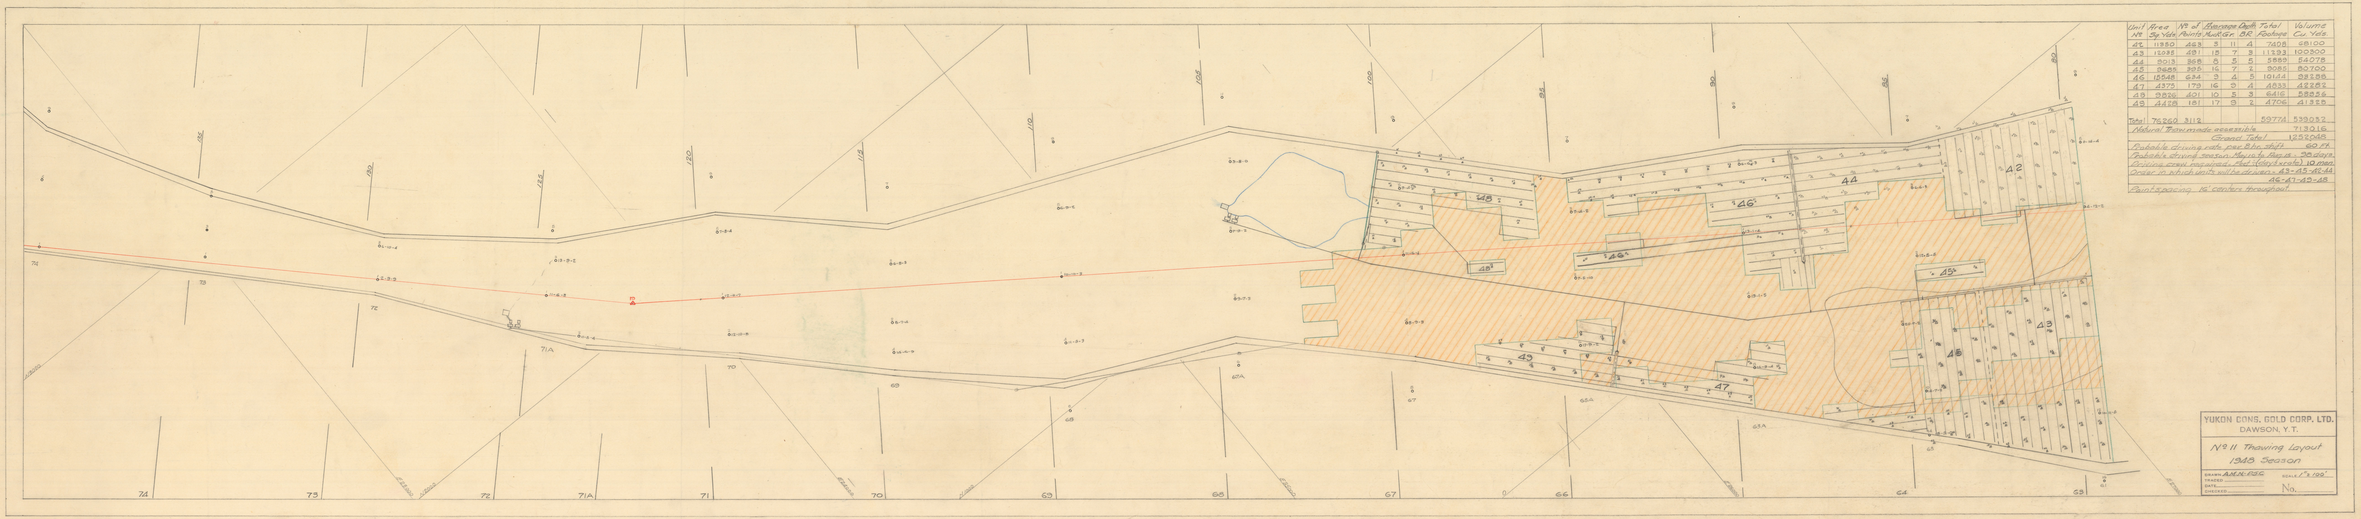

Unit Area No.	Sq. Yds.	No. of Points	Median	Average Depth Bedrock	Total Bedrock	Volume Cu. Yds.
42	11350	483	3	11	4	7408	68100
43	11098	481	15	7	3	11333	100300
44	9013	368	5	5	5	5889	54078
45	8665	395	14	7	2	8086	80700
46	15548	634	3	4	5	10144	92388
47	4375	179	16	9	4	4033	42282
48	9836	401	10	5	3	6416	58856
49	4148	181	17	8	2	4706	41325
Total	76260	3112				59774	539032
Natural Pay made accessible							713016
Grand Total							1252048

Probable drawing rate per 8 hr. shift 60 ft.
Probable drawing season, Mays to Nov. 30 days.
Drawing crew required, Shift (Night or Day) 10 men.
Order in which units will be drawn 43-45-42-44
46-47-49-48
Point spacing 16' centers throughout.

e011156336
