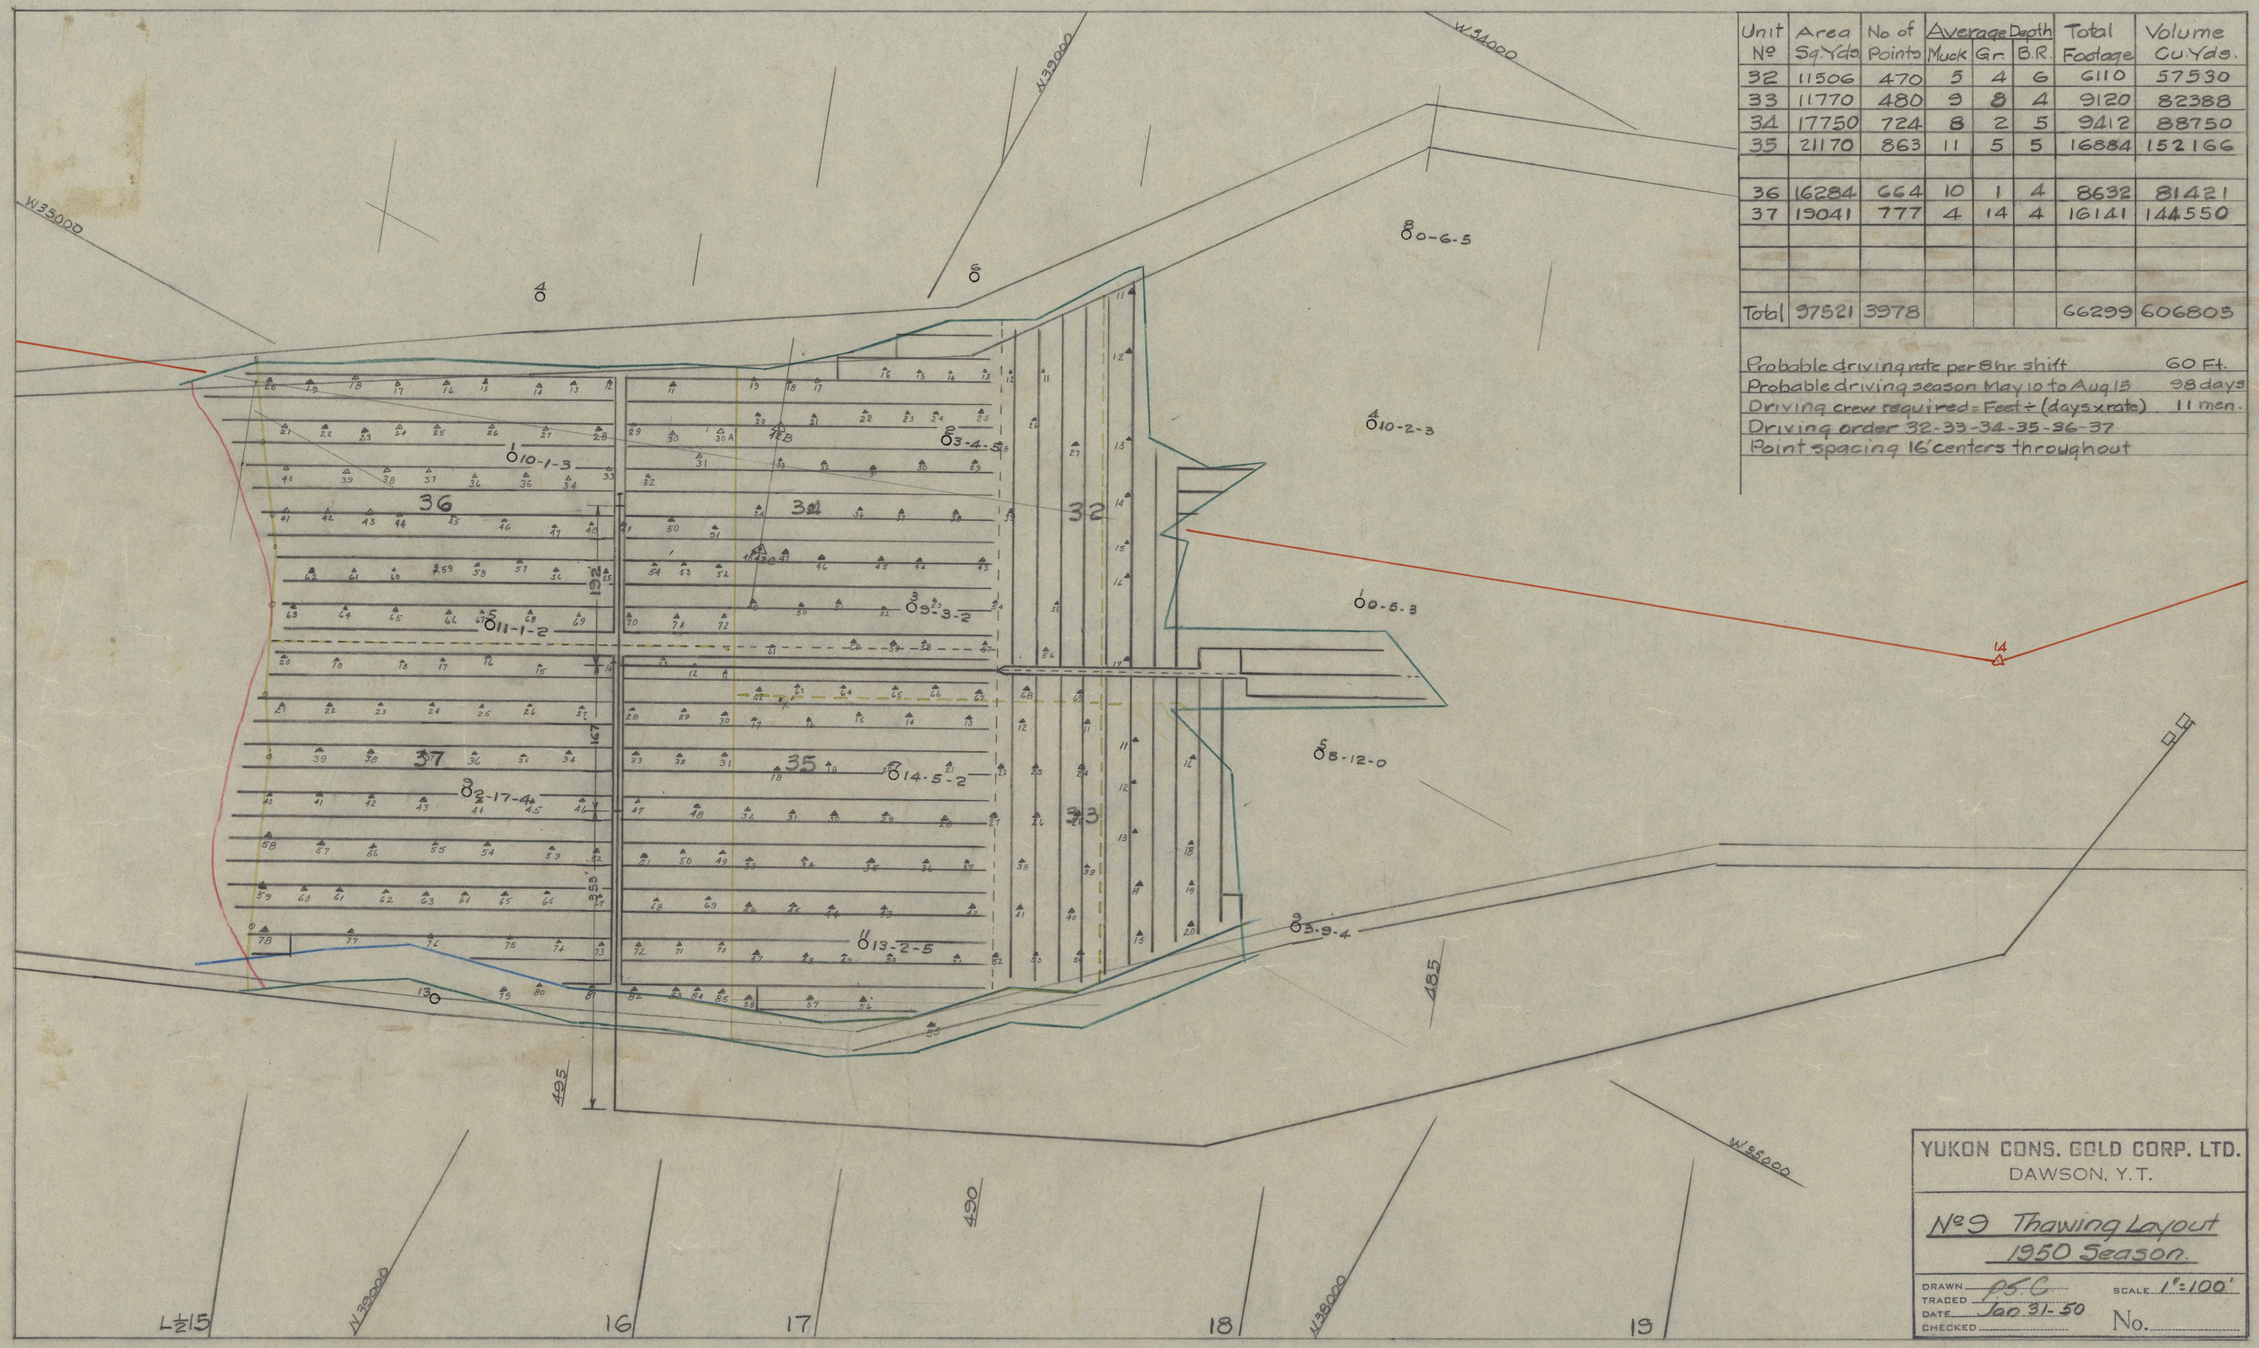


| Unit No | Area Sq Yds | No of Points | Average Depth Muck | Gr. | B.R. | Total Footage | Volume Cu Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11506 | 470 | 5 | 4 | 6 | 6110 | 57530 |
| 33 | 11770 | 480 | 9 | 8 | 4 | 9120 | 82388 |
| 34 | 17750 | 724 | 8 | 2 | 5 | 9412 | 88750 |
| 35 | 21170 | 863 | 11 | 5 | 5 | 16884 | 152166 |
| | | | | | | | |
| 36 | 16284 | 664 | 10 | 1 | 4 | 8632 | 81421 |
| 37 | 19041 | 777 | 4 | 14 | 4 | 16141 | 144550 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | 97521 | 3978 | | | | 66299 | 606805 |

Probable driving rate per 8 hr. shift — 60 Ft.
Probable driving season May 10 to Aug 15 — 98 days
Driving crew required = Feet ÷ (days x rate) — 11 men.
Driving order 32-33-34-35-36-37
Point spacing 16' centers throughout

YUKON CONS. GOLD CORP. LTD.
DAWSON, Y.T.

No 9 Thawing Layout
1950 Season.

DRAWN P.S.G.
TRACED
DATE Jan 31-50
CHECKED
SCALE 1" = 100'
No.

YCGC26717
